

364/130423/15

EAN nr. :
 Teller nr. :
 Stand I : II :

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN

WERF OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / ~~centralebezoek~~ op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
 volgens : AREI art. 86 / AREI art. 87 / AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276 /

Aanvulling verslag nr.

Aard installatie : Nieuwe / Uitbreiding / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitting meter / Spanningswijziging / Overdracht eigendom

Type der lokalen :

Plaats van onderzoek

11/5.2 Jelle

Installateur : ~~.....~~ Rodd

BTW : ID-kaart :

Onderzoeker : Cardens

Datum van onderzoek : 23/04/2013

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V ~~3 x 230 V~~ ~~3 x 380 V + N~~ Max. Beveiliging : 90 Omschakelaar : stand :

Hoofdbeveiliging : Zek. : 40 Schak. :

Meter-bordverbinding : kabeltype : KVB aantal geleiders : 4 doorsnede : 10 mm²

Voedingsbekabeling : kabeltype :

Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig

Aardelektrode : Type : lus / baan / peenen / horizontale geleiders Sectie : 25 mm² Spreidingswaarde : 2,49 Ω

Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 11 Algemene isolatieweerstand : 250 MΩ

Diff. schak. : algemene : 2 p 90 A 1300 mA bijkomende : 2 p 90 A 130 mA

werking testknop : in orde - niet in orde

controle foutlus : in orde - niet in orde

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - ~~neen~~

Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - niet in orde

Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde

onrechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde

Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - niet in orde

Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - niet in orde

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - toestellen :

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I)

N Houtequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.

N Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

geen

BESLUIT

De installatie is conform / niet conform met het AREI.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Het (de) eendraads- en situatieschema(s) werd(en) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 23/4/2038 zoals voorzien door art. 271 van het AREI,

alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag / mag niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde

inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

 voor de directeur,
 de onderzoeker

 erkend controle organisme
 vereniging zonder winstdoelmerk
 gewestelijke zetel: in elke provincie

 maatschappelijke zetel:
 Koningin Astridlaan 60
 2550 Kontich

 Tel. 03 / 451 37 00
 Fax 03 / 451 37 10

 www.ocb.be
 info@ocb.be


 BTW BE 0404.312.034
 PC 000-0162392-14
 Bank 405-3020501-49

 1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie.
 2) elke wijziging aan de elektr. installatie te melden in het dossier.
 3) onrechtstreekse aanraking te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.

 1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie.
 2) elke wijziging aan de elektr. installatie te melden in het dossier.
 3) onrechtstreekse aanraking te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.


 1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie.
 2) elke wijziging aan de elektr. installatie te melden in het dossier.
 3) onrechtstreekse aanraking te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.

03/005N/06/09/100

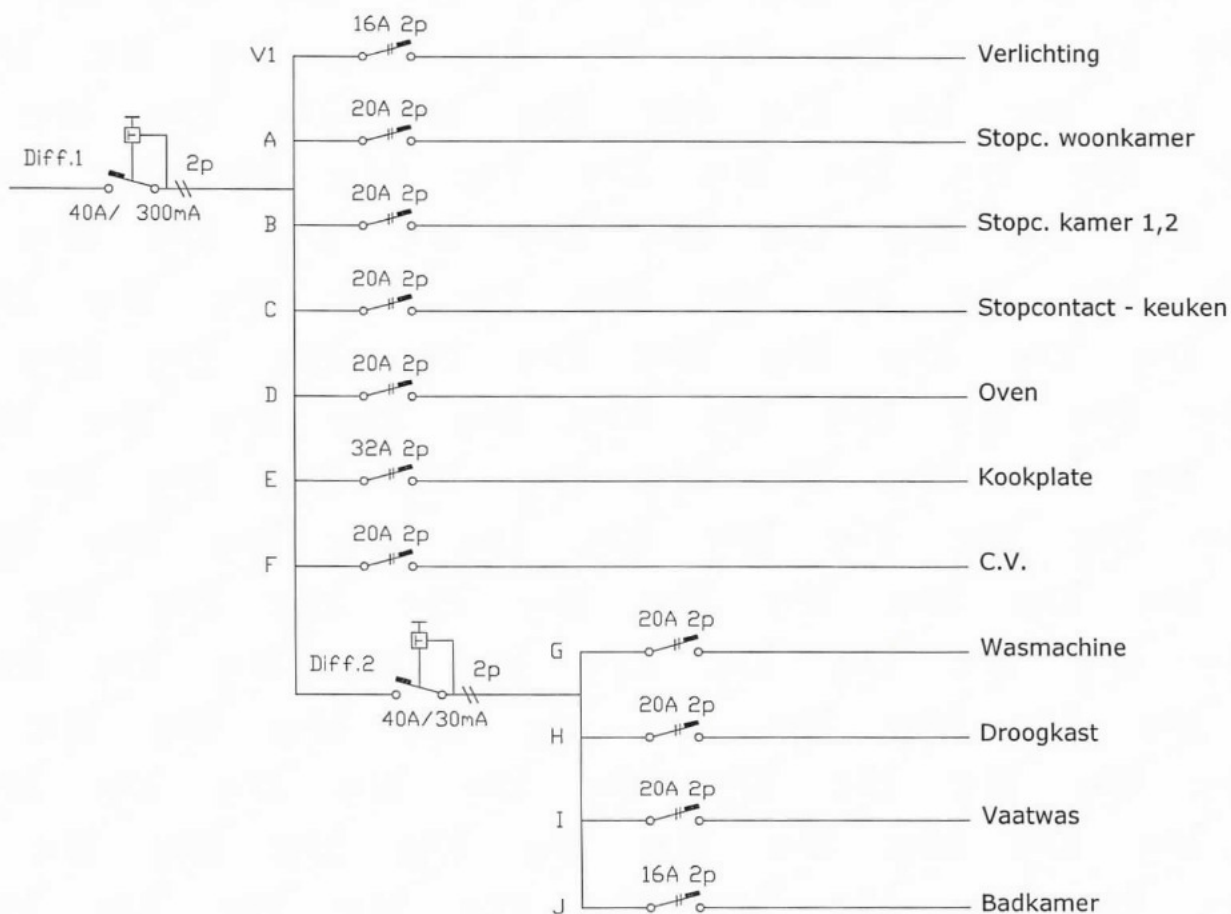


ID	Datum	Beschrijving	Get.
			Eendraadschema C5.1 Projectnummer : 20111143 Datum : 01.02.2013 Get: RMa Schaal:
Les Jardins de Jette			

Diff. 1



Diff. 2



ID	Datum	Beschrijving	Get.
		Les Jardins de Jette	
El.bord C5.1		Projectnummer : 20111143	
Datum : 01.02.2013		Get: RMa	
Schaal:			

