

Verslag aangaande huishoudelijke installatie op lage en zeer lage spanning (boek 1 KB 08/09/2019)



De installatie is conform met boek 1 van het KB van 08/09/2019.

Inlichtingen

Naam en voornaam eigenaar

[Redacted]

Adres eigenaar

[Redacted]

Opdrachtgever

: BaTiBV

Datum van onderzoek

: 22-06-2026

Installateur

: BaTiBV

BTW installateur

: /

Distributiebeheerder

: Fluvius Inewo

Agent-bezoeker

: S.A.

Plaats van onderzoek

[Redacted]

Verslagnummer

: 33216 / V 1

Identificatie van de installatie

Type bokaal

: Wooneenheid - Huis

EAN

: Niet beschikbaar

Tellernr

: 1SAG 3205123792

Max stroom (A)

: 40 A kVA

Nom . Spanning (V)

: 3x230 V

Type a.l.g. schakelaar

: Vermogensschakelaar

Aard van de stromen

: AC

Type aardverbindingssysteem

: TT

Voedingskabel (hoofd) bord

: Type: V0BSH07V-K - Sectie L: 10 mm² - N: 10 mm² - PE: 16 mm²

Voedingsbron

: Openbare distributienet

Decentrale LS productie-eenheid

: Aanwezig - Type: Zonne-energie (PV)

Gegevens van de uitgevoerde controle

Bestaand verslag aanwezig

Nee

Type bezoek

Gelijkvormigheidscontrole (Hfst 6.4), Wijziging of Uitbreiding (6.4.7.3.)

Uitvoeringsdatum *

Na 01.03.2025

*volgens verkregen informatie

Afwijkende bepalingen

Niet toegepast

Bijzondere installaties en/of ruimten

Fotovoltaïsche installatie (7.112.)

Schem a's, p lannen en docum enten

Stroombaanschem a's	: Aanwezig - O overeenstem m ing: Conform
Struggedatum : 2026-06-22	
Situatieplan	: Aanwezig - O overeenstem m ing: Conform
Struggedatum : 2026-06-22	
Voorwerp van uitgevoerde controle	: Zie ontvangen schem a's en/of p lannen
Aantal verdeelborden	: 1
Aantal (eind) stroom banen	: 2
N° reserve stroom banen	: -
Lijst van de evacuatie wegen en de moeilijk evacueerbare ruim ten	: Niet van toepassing
Plan van veiligheidsinstallaties en/of kritische installaties	: Niet van toepassing
Lijst met veiligheidsinstallaties en/of kritische installaties	: Niet van toepassing

Controles, beproevingen en m etingen

Differentieelstroom bescherm ingsinrichtingen (DSI)	: Aanwezig
Continuïteit bescherm ingsgeleiders	: Conform
Continuïteit equipotentiaalverbindingen	: Hoofdequipotentiaal: Conform - Bijkom ende equipotentiaalverbinding: Conform
Bescherm ing indirect contact	: Voldoende
Staat vast (opgesteld/geïnstalleerd) materieel	: Conform
Visuele controle van vast of vast opgesteld materieel	: Conform
Visuele controle van verplaatsbaar materieel	: Conform
Elektrisch materieel f.v. uiterlijke invbeden	: Conform
Bescherm ing tegen rechtstreekse aanraking	: Voldoende
Beveiligingen in overeenstem m ing m et de doorsnede geleiders, toestellen en materieel	: Conform
Beveiligingen tegen overstroom	: Conform
Bescherm ing tegen therm ische invbeden	: Conform
Type aardelektrode	: Aardingspennen

M etingen

Meetapparatuur waarvan de agent-bezoeker titularis is

Spreadingsweerstand io m .DSI	: Conform - 15.7 0 hm
Algemeen isolatieniveau	: Conform - 1,47 M 0 hm

De isolatiem eting werd niet uitgevoerd op de meet- en regeltechnische installaties, de ZLS installaties en DC -kringen van fotovoltaïsche installaties.

Besluit

De elektrische installatie (die deel uitmaakt van onze controle) voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, uitgezonderd de hierboven vermelde opmerkingen en/of nota's. Het de ééndraadsschema(s) en het situatiediagram(nen) zijn getekend voorgezien. De algemene differentiebescherming(inrichting(en)) is (zijn) verzege(d).

De installatie moet nagezien worden uiterlijk 22-06-2021 alvorens indien nodig na modificatie of belangrijke uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.

Raadgevingen voor huishoudelijke installaties

De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden

- a) het verslag van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie ;
- b) de verplichting in het dossier te laten wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden ;
- c) de verplichting de methode toezicht te belasten aan de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft om tijdig in te treden over elk ongeval aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit ;
- d) de verplichting, wanneer er inbreuken zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de inbreuken verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.



De agent-bezoeker

Inbreuken en/of opmerkingen en/of nota's

Inbreuken Lijst

Geen

Opmerkingen Lijst

- Het voorwerp van onze controle beperkt zich tot de aangeduide deuren van de installatie opgenomen in het verslag en/of de pannen en/of nota's en/of in bijlagen.
- De visuele controle beperkt zich tot de gemakkelijk zichtbare en bereikbare delen. De verborgen delen zoals delen in vaste plafonds, in holte wanden, in putten enzovoort zijn uitgesloten van onze controle.
- De uitgevoerde controle is een momentopname. Dit verslag is slechts een weerspiegeling van de elektrische installatie op het ogenblik van de controle.

Nota's Lijst

Geen

Oplijsting DSI

I _n (A)	63	I _t	22,5kA ^{2s} -3000A
I _{Δn} (mA)	300	Type	A
A ₁ gem een of B ₁ kom end	A ₁ gem een <=300mA	Verzegeld?	JA
Testknop	OK	Controle foutlus en aansluiting	OK

Fotovoltaïsche installatie

PV-panelen	Aantal: 12			
	Vermogen (Wp): 450			
	TotaalVermogen (Wp): 5400			
Geen PV-productie bij afwezigheid netspanning		OK	Specifieke maatregelen	OK

Omvormer Decentrale LS productie-eenheid

Type	String (PV)		
Merk	So ₁	Model	S6-GR1P5K
Serie n°	1002050228030018	Max AC vermogen (VA)	5000
Veiligheidsonderbreking en/of Afgeschakeling automatisch scheidingssysteem < 5sec	OK	Bescherming overstroom op bestaande installatie	OK

Foto's-1

RI




RA



Foto's-2



SITUATIE SCHEMA

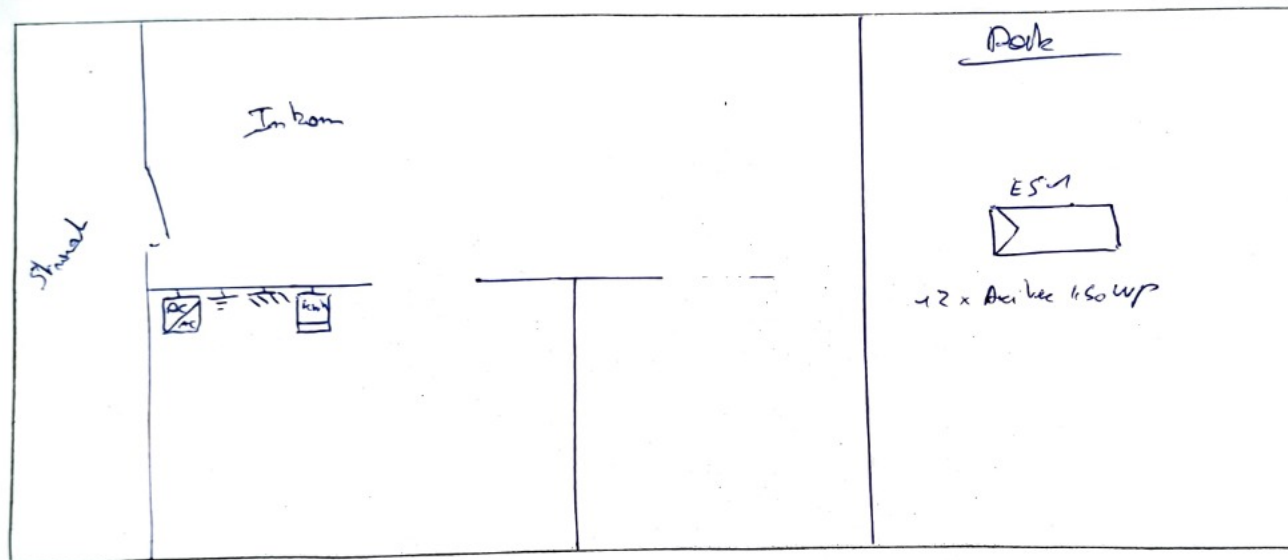

Pagina: 8/9



Handtekening installateur:

Belgate
de energie voor morgen
Belgate vzw - Energie Certificeringscentrum
Luchthavenweg 214 - 1050 Vilvoorde
Tel: 02 280 90 23 - BTW BE0584 752 015
info@belgate.be - www.belgate.be
SELM KIBEL

Balti Solar,
Torkonjestraat 21F
8510 Marke

BTW: BE 0690.584.471
TEL: 056 123 333

22 juni, 2026

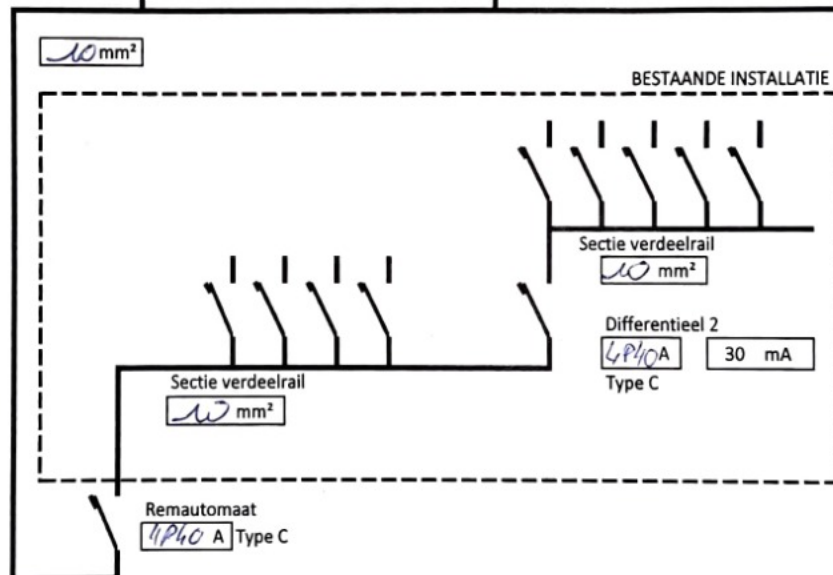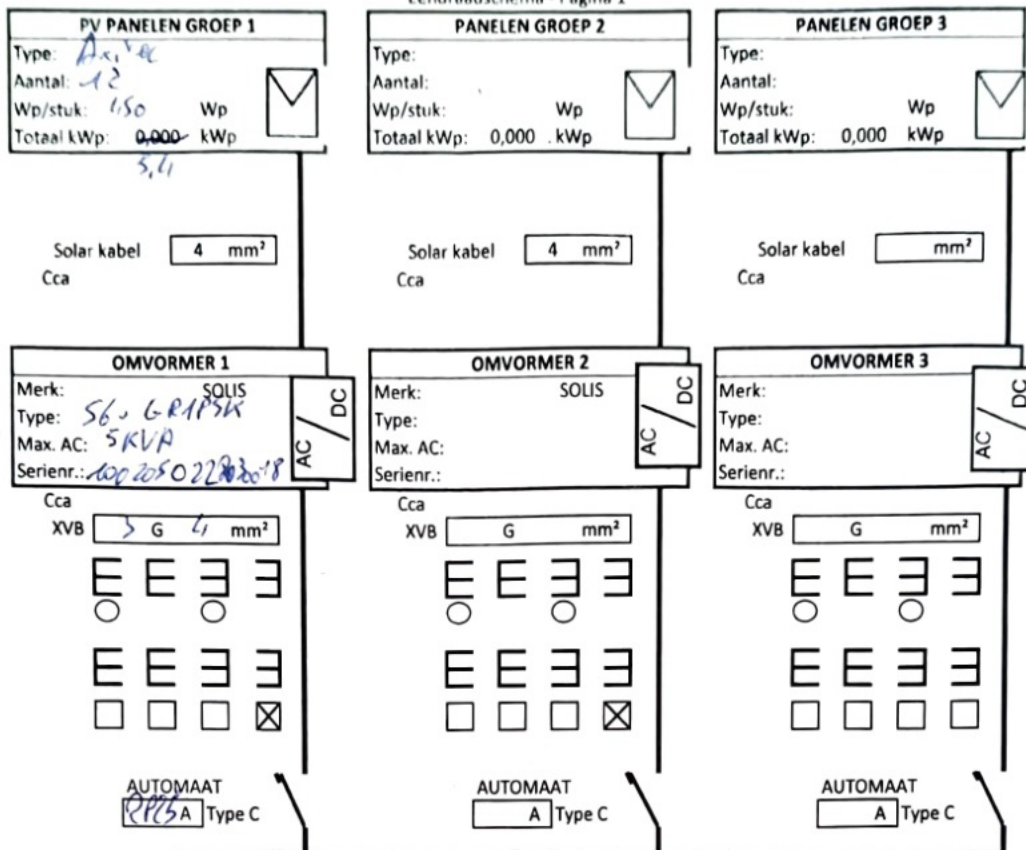

Pagina: 9/9

kWh	kWh teller
	1x 230V
	<i>2x 230V</i>

Datum:	<i>16/06/2026</i>
Auteur:	Balti bv

Gegevens aanmelding EANDIS/INFRAX	
EAN:	
Email:	
Tel.:	

22/06/2026

Belgate
 Belgate bv - Eendracht Controltechniek
 Luchthaven 75a - 1059 VV Amsterdam
 Tel: 020 200 82 21 - 0796 800000
 info@belgate.nl - www.belgate.nl
 SEHM ABEL
